

Aktueller Baufortschritt


// 2. Quartal 2020

Die Decke des ersten Obergeschosses inklusive der Balkonkragplatten ist fertiggestellt worden. Das für die tragenden Wände des Dachgeschosses notwendige Steinmaterial befindet sich zum größten Teil bereits auf der Decke. Sowohl die Wohnungsumfassungswände als auch die Trennwände wurden angelegt. Mit der Aufmauerung ist begonnen worden.

Im nächsten Schritt werden die tragenden Wände des Dachgeschosses auf Raumhöhe gebracht, um dann die Decke über diesem Geschoß betonieren und das Dach richten zu können.



Haus 10 – Fertiggestellte Balkonkragplatten

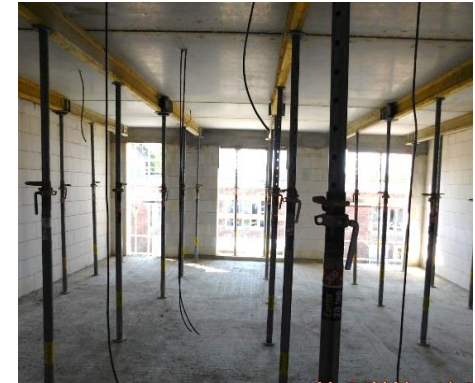

Wohnung im ersten Obergeschoss



Anlieferung des Steinmaterials erfolgt



Beginn der Aufmauerung

WAS PASSIERT AUF DER BAUSTELLE?

